

Commune de

GUISCARD

**PLAN LOCAL
D'URBANISME**

REVISION

**DOCUMENT
PROVISOIRE**

ARRET

Vu pour être annexé à la
délibération en date du :

12 AVR. 2021

7a

DEFENSE INCENDIE

Défense Incendie de la commune de GUISCARD

60291

GUISCARD

Hydrants

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	Débits en m3 / h			Pressions		* Etat	* Anomalie	* Accès	* Visite	Anomalies	Observations
					Maxi	à 1 bar	à 0,6 bar	Statique	Dynamique						
00001	P100	137 RUE DU GENERAL LECLERC DEVANT LA PLACE DE LA MAIRIE	125	100/2x070	175,00	164,00		7,50		✓	✓	✓	✓		Bayard Mesures du service des eaux le 26/06/2013
00002	P100	RUE DU GENERAL LECLERC FACE AU 372	125	100/2x070	159,00	146,00		6,50		✓	✓	✓	✓		Pont à mousson Mesures du service des eaux le 26/06/2013
00003	P100	RUE HELENE VERSEPUY	100	100/2x070	124,00	116,00		7,50		✓	✓	✓	✓		Bayard Mesures du service des eaux le 26/06/2013
00004	P100	RUE HELENE VERSEPUY	100	100/2x070	83,00	74,00		8,00		✓	✗	✓	✓	Ouverture point d'eau difficile	Pont à mousson Mesures du service des eaux le 26/06/2013
00005	P100	RUE DE L'EQUIPEE	125	100/2x070	192,00	176,00		6,30		✓	✓	✓	✓		Bayard Mesures du service des eaux le 26/06/2013
00007	P100	RUE MARCEL VISEUR FACE AU N° 201	150	100/2x070	241,00	221,00		7,50		✓	✓	✓	✓		Bayard Mesures du service des eaux le 26/06/2013
00008	B100	RUE MARCEL POULAIN PLACE DE MAGNY	125	100	186,00	171,00		8,00		✓	✗	✓	✓	Défaut de signalisation	Bayard Mesures du service des eaux le 26/06/2013
00009	P070	RUE DU CHATEAU EGLISE	060	070	44,00	40,00	42,00	8,00		✗	✗	✓	✓	Non conforme : débit inférieur à 60 m3/h PRISE ACCESSOIRE FERMETURE DU COFFRE CASSEE	Pont à mousson Mesures du service des eaux le 26/06/2013
00010	P070	RUE DU CHEMIN BLANC	060	070	52,00	47,00	49,00	8,00		✗	✗	✓	✓	Non conforme : débit inférieur à 60 m3/h PRISE ACCESSOIRE	Bayard Mesures du service des eaux le 26/06/2013
00011	P100	358 RUE MARCEL POULAIN	125	100/2x070	178,00	159,00		7,80		✓	✗	✓	✓	Ouverture point d'eau difficile	Pont à Mousson Mesures du service des eaux le 26/06/2013
00012	P65	19 SQUARE JEAN MOLUIN	080	070	58,00	52,00	56,00	7,50		✗	✗	✓	✓	Non conforme : débit inférieur à 60 m3/h PRISE ACCESSOIRE	Bayard Mesures du service des eaux le 26/06/2013
00013	P100	RUE DU CHEMIN BLANC FACE AU GYMNASSE	100	100/2x070	124,00	116,00		7,80		✓	✗	✓	✓	PAS DE FERMETURE CAPOT	Bayard Mesures du service des eaux le 26/06/2013

Légende

* Etat
* Anomalie
* Visite
* Accès

✗ -Indisponible
✗ -Avec anomalies
✗ -Non autorisée
✗ -Problématique

✓ -En service
✓ -Sans anomalie
✓ -Autorisée
✓ -Sans problème

✗ -Non conforme
en service

Défense Incendie de la commune de GUISCARD

Hydrants

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	Débits en m3 / h			Pressions		* Etat	* Anomalie	* Accès	* Visite	Anomalies	Observations
					Maxi	à 1 bar	à 0,6 bar	Statique	Dynamique						
00014	P100	170 RUE DES ACCACIAS	100	100/2x070	152,00	141,00		7,50		✓	✗	✓	✓	POTEAU INSTALLE DANS UN BAC A FLEURS	Pont à mousson Mesures du service des eaux le 26/06/2013
00015	P100	246 SQUARE DU DOCTEUR GOULLIEUX	100	100/2x070	86,00	80,00		7,50		✓	✓	✓	✓		Pont à mousson Mesures du service des eaux le 26/06/2013
00016	P100	9 RESIDENCE LES MESANGES	100	100/2x070	133,00	125,00		7,50		✓	✓	✓	✓		Pont à mousson Canalisation de 110mm Mesures du service des eaux le 26/06/2013
00017	P100	RUE MARCEL POULAIN FACE AU 552	125	100/2x070	176,00	162,00		7,50		✓	✓	✓	✓		Pont à mousson Mesures du service des eaux le 26/06/2013
00018	P100	806 RUE MARCEL POULAIN	125	100/2x070	182,00	165,00		7,00		✓	✓	✓	✓		Pont à mousson Mesures du service des eaux le 26/06/2013
00019	P100	6 RESIDENCE CONSTANT BOURGEOIS	125	100/2x070	134,00	124,00		7,00		✓	✓	✓	✓		Bayard Mesures du service des eaux le 26/06/2013
00020	P100	RUE DU LIEUTENANT GABRIEL LALANNE CENTRE DE SECOURS	100	100/2x070	85,00	80,00		6,00		✓	✓	✓	✓		Bayard Mesures du service des eaux le 26/06/2013
00021	P100	330 RUE DES ACCACIAS	100	100/2x070	214,00	197,00		7,00		✓	✓	✓	✓		Pont à mousson Mesures du service des eaux le 26/06/2013
00022	P070	RUE DU BRULE HAMEAU DE BUCHOIRE	080	070	32,00	30,00	31,00	7,50		✗	✗	✓	✓	Non conforme : débit inférieur à 60 m3/h Prise accessoire	Pont à mousson Mesures du service des eaux le 26/06/2013
00023	P65	IMPASSE DE LA PLACE HAMEAU DE BUCHOIRE DERRIERE LA MARE	080	070	32,00	28,00	29,00	7,50		✗	✗	✓	✓	Non conforme : débit inférieur à 60 m3/h Prise accessoire	Bayard Mesures du service des eaux le 26/06/2013
00024	P100	RUE DE FRENICHES AU CHRIST - HAMEAU DE BETHANCOURT	100	100/2x070	62,00	60,00	60,00	8,00		✓	✓	✓	✓		Pont à mousson Mesures du service des eaux le 26/06/2013
00025	P100	RUE DE FRENICHES HAMEAU DE TIRLANCOURT	100	100/2x070	57,00	53,00	54,00	7,50		✗	✗	✓	✓	Non conforme : débit inférieur à 60 m3/h PRISE ACCESSOIRE	Pont à mousson Mesures du service des eaux le 26/06/2013
00026	P070	RUE DE LA WARNELLE HAMEAU DE BEINES	080	070	16,00	15,00	15,00	6,00		✗	✗	✓	✓	Non conforme : débit inférieur à 60 m3/h NON CONFORME	Pont à mousson Mesures du service des eaux le 26/06/2013

Légende

* Etat	✗ -Indisponible	✓ -En service	✗ -Non conforme en service
* Anomalie	-Avec anomalies	-Sans anomalie	
* Visite	-Non autorisée	-Autorisée	
* Accès	-Problématique	-Sans problème	

Défense Incendie de la commune de GUISCARD

Hydrants

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	Débits en m3 / h			Pressions		* Etat	* Anomalie	* Accès	* Visite	Anomalies	Observations
					Maxi	à 1 bar	à 0,6 bar	Statique	Dynamique						
00027	P070	158 RUE DE WARNELLE HAMEAU DE BEINES	080	070	18,00	15,00	16,00	6,50						Non conforme : débit inférieur à 60 m3/h NON CONFORME	Pont à mousson Mesures du service des eaux le 26/06/2013
00028	P070	FERME DE BOUTAVENT HAMEAU DE BEINES	080	070	12,00	6,00	7,00	3,50						Non conforme : débit inférieur à 60 m3/h Non conforme	Pont à mousson Mesures du service des eaux le 26/06/2013
00029	P070	156 RUE DE ROUVREL - D39 HAMEAU DE ROUVREL	060	070	13,00	5,00	6,00	4,80						Non conforme : débit inférieur à 60 m3/h Non conforme Diamètre d'alimentation de 60 mm	Pont à mousson Mesures du service des eaux le 26/06/2013
00030	P100	CHATEAU DE MESMY HAMEAU DE TIRLANCOURT	100	100/2x070	56,00	40,00	43,00	5,00						Non conforme : débit inférieur à 60 m3/h Végétation gênante Accès difficile Prise accessoire	Pont à mousson Mesures du service des eaux le 26/06/2013
00031	P100	RUE DU POTAGER	150	100/2x070	176,00	161,00		7,70							Bayard Mesures du service des eaux le 26/06/2013
00032	P100	RUE DU CHAUFFOUR	250	100/2x070	222,00	203,00		6,50							Bayard Mesures du service des eaux le 26/06/2013
00033	P100	RUE DE L'ORANGERIE	150	100/2x070	176,00	165,00		8,00							Bayard Mesures du service des eaux le 26/06/2013
00034	P100	28 RUE DU PARC	150	100/2x070	158,00	145,00		7,20							AVK SMHM Mesures du service des eaux le 26/06/2013

Légende

* Etat -Indisponible -En service -Non conforme en service
 * Anomalie -Avec anomalies -Sans anomalie
 * Visite -Non autorisée -Autorisée
 * Accès -Problématique -Sans problème

Réserves

N°	Type	Adresse	Volume m3	m3 / h Ré-alim.	* Etat	* Anomalie	* Accès	* Visite	Anomalies	Observations
00038	CITE	RUE DE ROUVREL FACE AU 274 - HAMEAU DE ROUVREL	120	10						Aire d'aspiration : le trottoir et la route

Légende

* Etat -Indisponible -En service -Non conforme en service
 * Anomalie -Avec anomalies -Sans anomalie
 * Visite -Non autorisée -Autorisée
 * Accès -Problématique -Sans problème

Défense Incendie de la commune de GUISCARD

Légende


* Etat	✗	-Indisponible	✓	-En service	✗	-Non conforme en service
* Anomalie		-Avec anomalies		-Sans anomalie		
* Visite		-Non autorisée		-Autorisée		
* Accès		-Problématique		-Sans problème		

Réserves

N°	Type	Adresse	Volume m3	m3 / h Ré-alim.	* Etat	* Anomalie	* Accès	* Visite	Anomalies	Observations
00039	CITE	RUE DE LA WARNELLE HAMEAU DE BEINES	120	10	✓	✗	✓	✓	1/2 raccord mal positionné Pas de clé pour accéder au remplissage qui se situe derrière une grille.	
00040	RES	902 Rue du moulin Ferme du moulin de Maucourt	140	-	✓	✓	✓	✓		Privé




Conformités (*)

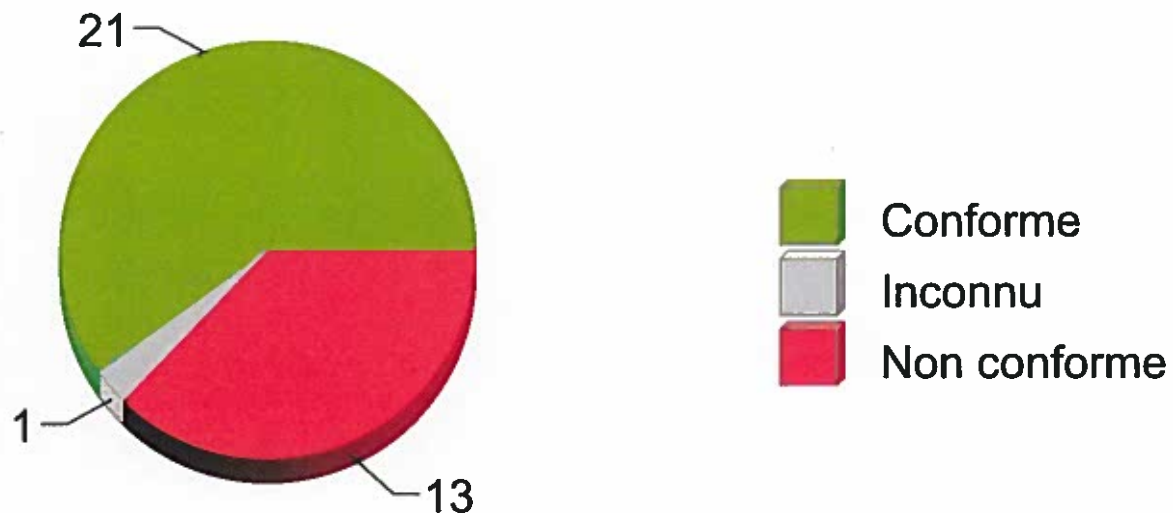


Vue d'ensemble



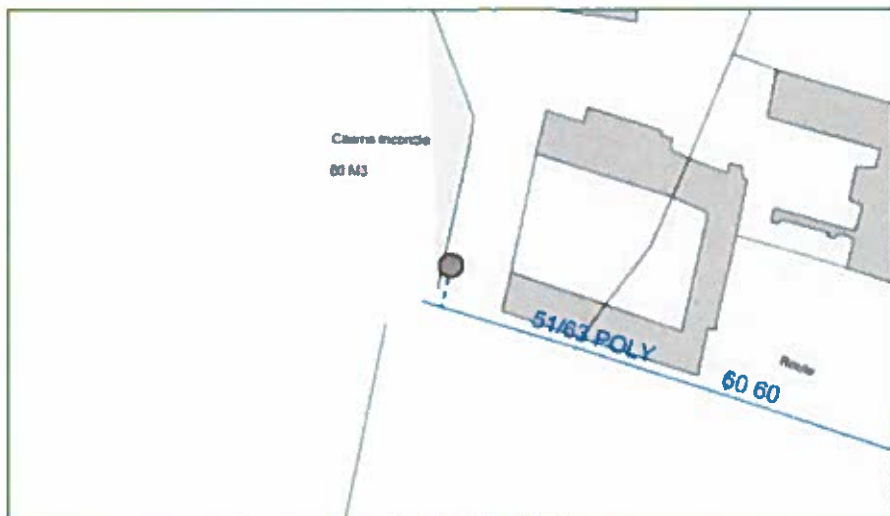

Type	Citerne incendie
Adresse	ROUTE DE GUISCARD
Date de pose	
Diametre	Inconnu
Marque	
Statut	Public
Pression	
Conformite (*)	inconnu
Dernière Opération	
Disponibilité	

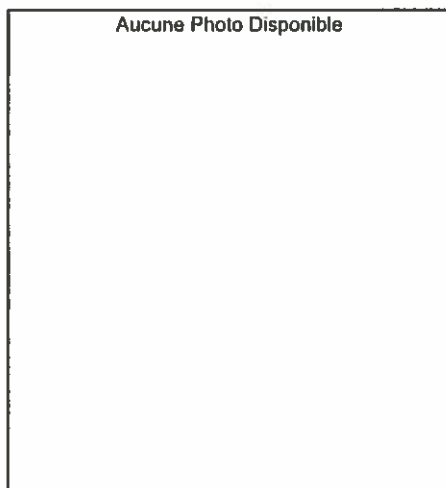

Visites

Date épreuve	Responsable	Coffre cassé	Présence bouchon	Commentaire
--------------	-------------	--------------	------------------	-------------

Mesures


Date épreuve	Heure d'épreuve	Pression statique(bar)	Pression dynamique (bars)	Pression dynamique secondaire (bars)	Débit maximum (m3/h)	Débit 1 bar (m3)
--------------	-----------------	------------------------	---------------------------	--------------------------------------	----------------------	------------------

Entretiens - Interventions

Date	Type	Commentaire
------	------	-------------



Type	Citerne incendie
Adresse	704 VOIE COMMUNALE N 9
Date de pose	
Diametre	Inconnu
Marque	
Statut	Public
Pression	
Conformite (*)	Non Conforme
Dernière Opération	24/02/2014
Disponibilité	Oui

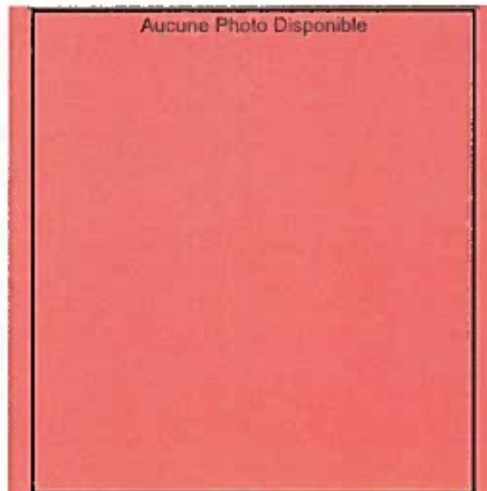

Visites

Date épreuve	Responsable	Coffre cassé	Présence bouchon	Commentaire
24/02/2014	DOS SANTOS LAURENT			
05/03/2008	BELLEGUIC LOIC			

Mesures

Date épreuve	Heure d'épreuve	Pression statique(bar)	Pression dynamique (bars)	Pression dynamique secondaire (bars)	Débit maximum (m3/h)	Débit 1 bar (m3)

Entretiens - Interventions

Date	Type	Commentaire



Type	Poteau incendie
Adresse	137 RUE DU GENERAL LECLERC
Date de pose	
Diametre	100
Marque	Bayard - Saphir
Statut	Public
Pression	Oui
Conformite (*)	Conforme
Dernière Opération	06/04/2017
Disponibilité	Oui

Aucune Photo Disponible

Visites

Date épreuve	Responsable	Coffre cassé	Présence bouchon	Commentaire
06/04/2017	CROCHET LUDOVIC	SO	Oui	
09/05/2016	DOS SANTOS LAURENT	SO	Oui	
23/02/2015	DOS SANTOS LAURENT	SO	Oui	
24/02/2014	DOS SANTOS LAURENT	SO	Oui	
26/06/2013	DOS SANTOS LAURENT	SO	Oui	

Mesures

Date épreuve	Heure d'épreuve	Pression statique(bar)	Pression dynamique (bars)	Pression dynamique secondaire (bars)	Débit maximum (m3/h)	Débit 1 bar (m3)
06/04/2017	14:25:00	7	1		110	99
09/05/2016	13:57:00	6.8	1		116	102
23/02/2015	14:12:00	7	1		114	110
24/02/2014	08:51:00	6.8	1		104	93
26/06/2013	11:00:00	7.5	1		175	164

Entretiens - Interventions

Date	Type	Commentaire
------	------	-------------



Type	Poteau incendie
Adresse	365 RUE DU GENERAL LECLERC
Date de pose	
Diametre	100
Marque	PAM/RATIONNEL
Statut	Public
Pression	Oui
Conformite (*)	Conforme
Dernière Opération	06/04/2017
Disponibilité	Oui

Aucune Photo Disponible

Visites

Date épreuve	Responsable	Coffre cassé	Présence bouchon	Commentaire
06/04/2017	CROCHET LUDOVIC	SO	Oui	
09/05/2016	DOS SANTOS LAURENT	SO	Oui	Fuite au carré de manoeuvre
23/02/2015	DOS SANTOS LAURENT	SO	Oui	Dur à la manoeuvre
24/02/2014	DOS SANTOS LAURENT	SO	Oui	
26/06/2013	DOS SANTOS LAURENT	SO	Oui	

Mesures

Date épreuve	Heure d'épreuve	Pression statique(bar)	Pression dynamique (bars)	Pression dynamique secondaire (bars)	Débit maximum (m3/h)	Débit 1 bar (m3)
06/04/2017	14:19:00	6	1		95	89
09/05/2016	14:05:00	6	1		104	90
23/02/2015	14:13:00	6.2	1		103	93
24/02/2014	09:02:00	6.	1		89	76
26/06/2013	11:27:00	6.5	1		159	146

Entretiens - Interventions

Date	Type	Commentaire
23/02/2015	D?montage, graissage et remontage tige de manoeuvre	Entretien fait : Le 08/04/2015



Type	Poleau incendie
Adresse	170 RUE HELENE VERSEPUY
Date de pose	
Diametre	100
Marque	Bayard - Saphir
Statut	Public
Pression	Oui
Conformite (*)	Conforme
Dernière Opération	06/04/2017
Disponibilité	Oui

Aucune Photo Disponible

Visites

Date épreuve	Responsable	Coffre cassé	Présence bouchon	Commentaire
06/04/2017	CROCHET LUDOVIC	SO	Oui	
09/05/2016	DOS SANTOS LAURENT	SO	Oui	
23/02/2015	DOS SANTOS LAURENT	SO	Oui	Bouchon diamètre 65 mm cassé
24/02/2014	DOS SANTOS LAURENT	SO	Oui	
26/06/2013	DOS SANTOS LAURENT	SO	Oui	

Mesures

Date épreuve	Heure d'épreuve	Pression statique(bar)	Pression dynamique (bars)	Pression dynamique secondaire (bars)	Débit maximum (m3/h)	Débit 1 bar (m3)
06/04/2017	14:32:00	7	1		92	84
09/05/2016	14:14:00	7.4	1		98	87
23/02/2015	14:15:00	7.4	1		99	84
24/02/2014	09:11:00	7	1		93	81
26/06/2013	11:33:00	7.5	1		124	116

Entretiens - Interventions

Date	Type	Commentaire
23/02/2015	Remplacement bouchons, chainettes et raccord symétriques DN65	Renouvellement d'un bouchon symétrique dn 65 fait le 16/06/2015



Type	Poteau incendie
Adresse	568 RUE HELENE VERSEPUY
Date de pose	
Diametre	100
Marque	PAM/RATIONNEL
Statut	Public
Pression	Oui
Conformite (*)	Conforme
Derniere Operation	06/04/2017
Disponibilité	Oui

Aucune Photo Disponible

Visites

Date épreuve	Responsable	Coffre cassé	Présence bouchon	Commentaire
06/04/2017	CROCHET LUDOVIC	SO	Oui	
09/05/2016	DOS SANTOS LAURENT	SO	Oui	
23/02/2015	DOS SANTOS LAURENT	SO	Oui	Dur à la manoeuvre
24/02/2014	DOS SANTOS LAURENT	SO	Oui	
27/06/2013	DOS SANTOS LAURENT	SO	Oui	Bouchon dn 65 mm cassé

Mesures

Date épreuve	Heure d'épreuve	Pression statique(bar)	Pression dynamique (bars)	Pression dynamique secondaire (bars)	Débit maximum (m3/h)	Débit 1 bar (m3)
06/04/2017	14:52:00	7.5	1		68	62
09/05/2016	14:18:00	7.4	1		70	62
23/02/2015	15:29:00	7.6	1		69	63
24/02/2014	09:17:00	7.3	1		71	63
27/06/2013	11:40:00	8	1		83	74

Entretiens - Interventions

Date	Type	Commentaire
23/02/2015	D?montage, graissage et remontage lige de manoeuvre	Entretien fait : Le 08/04/2015
27/06/2013	Remplacement bouchons, chainettes et raccord symétriques DN65	Pose d'un bouchon dn 65 mm



Type	Poteau incendie
Adresse	206 RUE DE L' EQUIPEE
Date de pose	
Diametre	100
Marque	Bayard - Saphir
Statut	Public
Pression	Oui
Conformite (*)	Conforme
Dernière Opération	06/04/2017
Disponibilité	Oui

Aucune Photo Disponible

Visites

Date épreuve	Responsable	Coffre cassé	Présence bouchon	Commentaire
06/04/2017	CROCHET LUDOVIC	SO	Oui	
09/05/2016	DOS SANTOS LAURENT	SO	Oui	
23/02/2015	DOS SANTOS LAURENT	SO	Oui	
24/02/2014	DOS SANTOS LAURENT	SO	Oui	
27/06/2013	DOS SANTOS LAURENT	SO	Oui	

Mesures


Date épreuve	Heure d'épreuve	Pression statique(bar)	Pression dynamique (bars)	Pression dynamique secondaire (bars)	Débit maximum (m3/h)	Débit 1 bar (m3)
06/04/2017	14:04:00	5.5	1		90	85
09/05/2016	14:18:00	6	1		101	93
23/02/2015	14:17:00	6	1		98	89
24/02/2014	09:18:00	5.8	1		85	73
27/06/2013	11:44:00	6.3	1		192	176

Entretiens - Interventions

Date	Type	Commentaire
20/09/2010	Remplacement bouchons, chainettes et raccord symétriques DN65	Pose d'un bouchon de 65 mm



Type	Poteau incendie
Adresse	3 SQUARE DU GENERAL WEYGAND
Date de pose	
Diametre	100
Marque	Pont-à-Mousson
Statut	Privé
Pression	Oui
Conformite (*)	Non Conforme
Dernière Opération	09/05/2016
Disponibilité	Oui

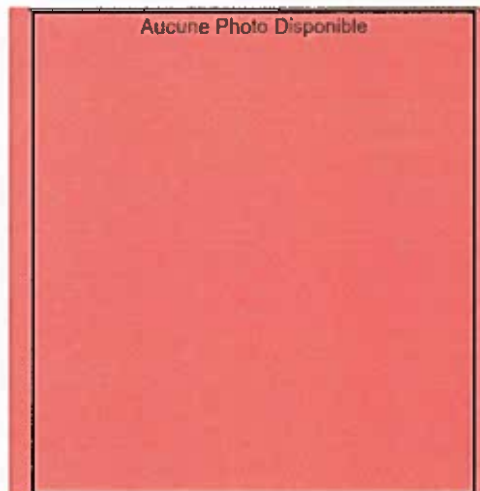

Visites

Date épreuve	Responsable	Coffre cassé	Présence bouchon	Commentaire
09/05/2016	DOS SANTOS LAURENT	SO	Oui	Poteau d'incendie plus, inclus dans la tournée. PI privé. USINE DANA
23/02/2015	DOS SANTOS LAURENT	SO	Oui	Poteau d'incendie, plus inclus dans la tournée. PI privé
24/02/2014	DOS SANTOS LAURENT	SO	Oui	
27/06/2013	DOS SANTOS LAURENT	SO	Oui	
11/03/2011	BELLEGUIC LOIC	SO	Oui	

Mesures

Date épreuve	Heure d'épreuve	Pression statique(bar)	Pression dynamique (bars)	Pression dynamique secondaire (bars)	Débit maximum (m3/h)	Débit 1 bar (m3)
09/05/2016	14:21:00	0	0		0	0
23/02/2015	14:45:00					
24/02/2014	09:42:00	5.7	1		67	61
27/06/2013	11:44:00	6	1		120	110
11/03/2011	15:39:00	6	1		119	109

Entretiens - Interventions

Date	Type	Commentaire
------	------	-------------



Type	Poteau incendie
Adresse	178 RUE MARCEL VISEUR
Date de pose	
Diametre	100
Marque	Bayard - Saphir
Statut	Public
Pression	Oui
Conformite (*)	Conforme
Dernière Opération	06/04/2017
Disponibilité	Oui

Aucune Photo Disponible

Visites


Date épreuve	Responsable	Coffre cassé	Présence bouchon	Commentaire
06/04/2017	CROCHET LUDOVIC	SO	Oui	
09/05/2016	DOS SANTOS LAURENT	SO	Oui	
23/02/2015	DOS SANTOS LAURENT	SO	Oui	
24/02/2014	DOS SANTOS LAURENT	SO	Oui	
27/06/2013	DOS SANTOS LAURENT	SO	Oui	

Mesures

Date épreuve	Heure d'épreuve	Pression statique(bar)	Pression dynamique (bars)	Pression dynamique secondaire (bars)	Débit maximum (m3/h)	Débit 1 bar (m3)
06/04/2017	09:58:00	7	1		108	96
09/05/2016	14:22:00	7	1		112	103
23/02/2015	14:32:00	7.2	1		102	82
24/02/2014	09:22:00	6.8	1		107	89
27/06/2013	11:46:00	7.5	1		241	221

Entretiens - Interventions

Date	Type	Commentaire

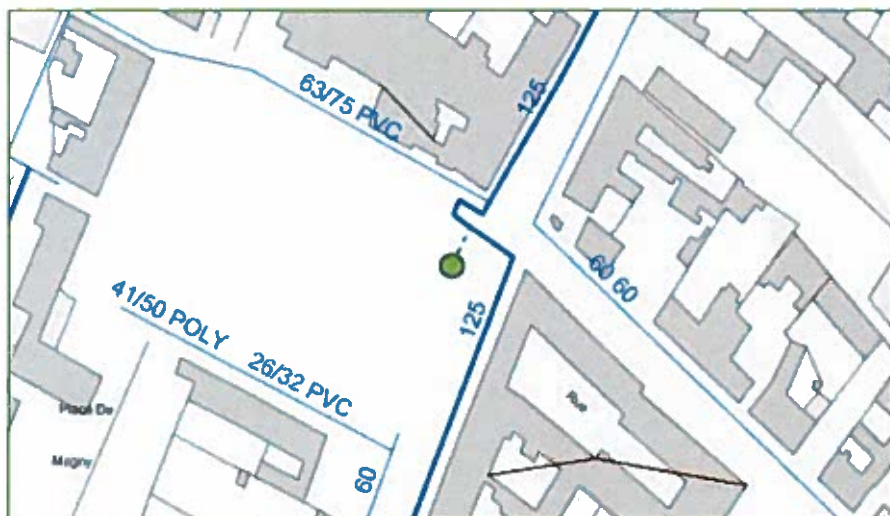

Type	Bouche incendie
Adresse	14 RUE DE L' EGLISE
Date de pose	
Diametre	100
Marque	Bayard
Statut	Public
Pression	Sans objet
Conformite (*)	Conforme
Dernière Opération	06/04/2017
Disponibilité	Oui

Aucune Photo Disponible

Visites

Date épreuve	Responsable	Coffre cassé	Présence bouchon	Commentaire
06/04/2017	CROCHET LUDOVIC			
09/05/2016	DOS SANTOS LAURENT			
23/02/2015	DOS SANTOS LAURENT			
24/02/2014	DOS SANTOS LAURENT			
27/06/2013	DOS SANTOS LAURENT			

Mesures


Date épreuve	Heure d'épreuve	Pression statique(bar)	Pression dynamique (bars)	Pression dynamique secondaire (bars)	Débit maximum (m3/h)	Débit 1 bar (m3)
06/04/2017	10:48:00	7.2	1		123	114
09/05/2016	14:23:00	7.5	1		147	139
23/02/2015	14:34:00	7.8	1		139	132
24/02/2014	09:23:00	7.5	1		135	118
27/06/2013	11:46:00	8	1		186	171

Entretiens - Interventions

Date	Type	Commentaire
------	------	-------------



Type	Poteau incendie
Adresse	217 RUE DU CHATEAU
Date de pose	
Diametre	60
Marque	Pont-à-Mousson - Tri - 80
Statut	Public
Pression	Oui
Conformite (*)	Non Conforme
Dernière Opération	06/04/2017
Disponibilité	Oui

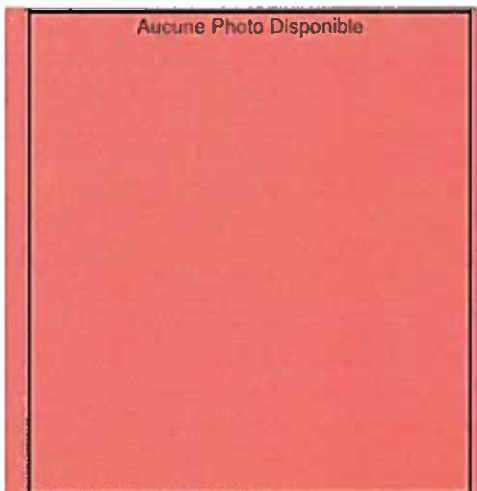

Visites

Date épreuve	Responsable	Coffre cassé	Présence bouchon	Commentaire
06/04/2017	CROCHET LUDOVIC	SO	Oui	Débit à 0.6 b 41 m3/h
09/05/2016	DOS SANTOS LAURENT	SO	Oui	Débit à 0.6 b 39 m3/h
23/02/2015	DOS SANTOS LAURENT	SO	Oui	
24/02/2014	DOS SANTOS LAURENT	SO	Oui	
27/06/2013	DOS SANTOS LAURENT	SO	Oui	

Mesures


Date épreuve	Heure d'épreuve	Pression statique(bar)	Pression dynamique (bars)	Pression dynamique secondaire (bars)	Débit maximum (m3/h)	Débit 1 bar (m3)
06/04/2017	14:41:00	7.5	1		42	39
09/05/2016	14:24:00	7.5	1		42	37
23/02/2015	15:28:00	7.7	1		43	40
24/02/2014	09:24:00	7.6	1		42	39
27/06/2013	11:47:00	8	1		44	42

Entretiens - Interventions

Date	Type	Commentaire
------	------	-------------



Type	Poteau incendie
Adresse	63 RUE FLORENCE ADRIAN
Date de pose	
Diametre	60
Marque	Pont-à-Mousson
Statut	Public
Pression	Oui
Conformite (*)	Non Conforme
Dernière Opération	06/04/2017
Disponibilité	Oui

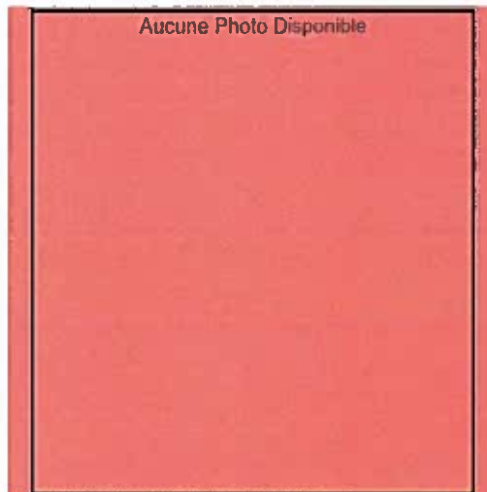

Visites

Date épreuve	Responsable	Coffre cassé	Présence bouchon	Commentaire
06/04/2017	CROCHET LUDOVIC	SO	Oui	Débit à 0.6 b 46 m3/h
09/05/2016	DOS SANTOS LAURENT	SO	Oui	
23/02/2015	DOS SANTOS LAURENT	SO	Oui	
24/02/2014	DOS SANTOS LAURENT	SO	Oui	
26/06/2013	DOS SANTOS LAURENT	SO	Oui	

Mesures

Date épreuve	Heure d'épreuve	Pression statique(bar)	Pression dynamique (bars)	Pression dynamique secondaire (bars)	Débit maximum (m3/h)	Débit 1 bar (m3)
06/04/2017	09:50:00	7.4	1		48	44
09/05/2016	13:58:00	7.6	1		78	74
23/02/2015	14:30:00	7.7	1		78	75
24/02/2014	08:53:00	7	1		39	35
26/06/2013	11:11:00	8	1		52	49

Entretiens - Interventions

Date	Type	Commentaire
------	------	-------------



Type	Poleau incendie
Adresse	358 RUE MARCEL POULIN
Date de pose	
Diametre	100
Marque	PAM/RATIONNEL
Statut	Public
Pression	Oui
Conformite (*)	Conforme
Dernière Opération	06/04/2017
Disponibilité	Oui

Aucune Photo Disponible

Visites

Date épreuve	Responsable	Coffre cassé	Présence bouchon	Commentaire
06/04/2017	CROCHET LUDOVIC	SO	Oui	
09/05/2016	DOS SANTOS LAURENT	SO	Oui	
23/02/2015	DOS SANTOS LAURENT	SO	Oui	Dur à la manoeuvre
24/02/2014	DOS SANTOS LAURENT	SO	Oui	
26/06/2013	DOS SANTOS LAURENT	SO	Oui	

Mesures


Date épreuve	Heure d'épreuve	Pression statique(bar)	Pression dynamique (bars)	Pression dynamique secondaire (bars)	Débit maximum (m3/h)	Débit 1 bar (m3)
06/04/2017	10:58:00	7.3	1		141	130
09/05/2016	13:59:00	7.3	1		150	132
23/02/2015	14:53:00	7.7	1		152	147
24/02/2014	08:54:00	7.5	1		142	129
26/06/2013	11:12:00	7.8	1		178	159

Entretiens - Interventions

Date	Type	Commentaire
23/02/2015	D?montage, graissage et remontage tige de manoeuvre	Entretien fait : Le 08/04/2015
11/03/2011	D?montage, graissage et remontage tige de manoeuvre	Débouchage de la vidange



Type	Poteau incendie
Adresse	20 RUE MARCEL VISEUR
Date de pose	
Diametre	80
Marque	Bayard - Saphir
Statut	Public
Pression	Oui
Conformite (*)	Non Conforme
Dernière Opération	06/04/2017
Disponibilité	Oui

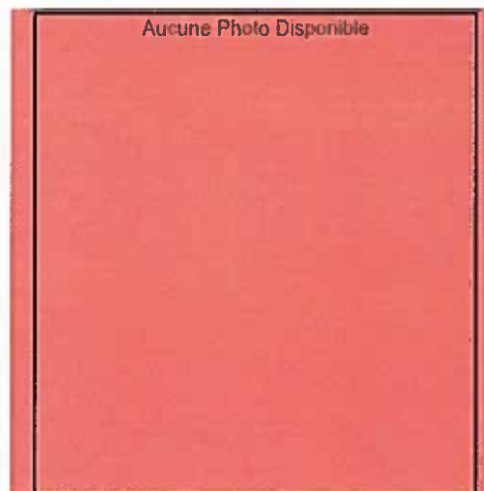

Visites

Date épreuve	Responsable	Coffre cassé	Présence bouchon	Commentaire
06/04/2017	CROCHET LUDOVIC	SO	Oui	Débit à 0.6 b 49 m3/h
09/05/2016	DOS SANTOS LAURENT	SO	Oui	Débit à 0.6 b 50 m3/h
23/02/2015	DOS SANTOS LAURENT	SO	Oui	
24/02/2014	DOS SANTOS LAURENT	SO	Oui	
26/06/2013	DOS SANTOS LAURENT	SO	Oui	

Mesures

Date épreuve	Heure d'épreuve	Pression statique(bar)	Pression dynamique (bars)	Pression dynamique secondaire (bars)	Débit maximum (m3/h)	Débit 1 bar (m3)
06/04/2017	10:06:00	7	1		51	47
09/05/2016	14:00:00	7.2	1		55	48
23/02/2015	14:34:00	7.4	1		53	51
24/02/2014	08:55:00	7	1		50	47
26/06/2013	11:13:00	7.5	1		58	56

Entretiens - Interventions

Date	Type	Commentaire
------	------	-------------



Type	Poteau incendie
Adresse	216 RUE DU CHEMIN BLANC
Date de pose	
Diametre	100
Marque	Bayard - Emeraude
Statut	Public
Pression	Non
Conformite (*)	Conforme
Dernière Opération	06/04/2017
Disponibilité	Oui

Aucune Photo Disponible

Visites

Date épreuve	Responsable	Coffre cassé	Présence bouchon	Commentaire
06/04/2017	CROCHET LUDOVIC	Non	Non	
09/05/2016	DOS SANTOS LAURENT	Non	Oui	
23/02/2015	DOS SANTOS LAURENT	Non	Oui	
24/02/2014	DOS SANTOS LAURENT	Non	Oui	
26/06/2013	DOS SANTOS LAURENT	Non	Oui	Manque serrure du coffre

Mesures

Date épreuve	Heure d'épreuve	Pression statique(bar)	Pression dynamique (bars)	Pression dynamique secondaire (bars)	Débit maximum (m3/h)	Débit 1 bar (m3)
06/04/2017	09:43:00	7.6	1		122	113
09/05/2016	14:00:00	7.5	1		144	136
23/02/2015	14:26:00	7.8	1		144	137
24/02/2014	08:56:00	7.8	1		123	114
26/06/2013	11:15:00	7.8	1		124	116

Entretiens - Interventions

Date	Type	Commentaire
06/04/2017	Remplacement bouchons, chainettes et raccord symétriques DN65	Pose d'un bouchon dn 65 le 20/04/2017
26/06/2013	AUTRE	Pose de serrure
20/09/2010	Peinture complète et entretien	Remplacement du coffre



Type	Poleau incendie
Adresse	170 RUE DES ACACIAS
Date de pose	
Diametre	100
Marque	Pont-à-Mousson
Statut	Public
Pression	Oui
Conformite (*)	Conforme
Dernière Opération	06/04/2017
Disponibilité	Oui

Aucune Photo Disponible

Visites


Date épreuve	Responsable	Coffre cassé	Présence bouchon	Commentaire
06/04/2017	CROCHET LUDOVIC	SO	Oui	
09/05/2016	DOS SANTOS LAURENT	SO	Oui	
23/02/2015	DOS SANTOS LAURENT	SO	Oui	
24/02/2014	DOS SANTOS LAURENT	SO	Oui	
26/06/2013	DOS SANTOS LAURENT	SO	Oui	

Mesures

Date épreuve	Heure d'épreuve	Pression statique(bar)	Pression dynamique (bars)	Pression dynamique secondaire (bars)	Débit maximum (m3/h)	Débit 1 bar (m3)
06/04/2017	09:32:00	7.4	1		148	139
09/05/2016	14:01:00	7.3	1		166	150
23/02/2015	14:25:00	7.5	1		163	152
24/02/2014	08:57:00	7.5	1		148	136
26/06/2013	11:21:00	7.5	1		152	141

Entretiens - Interventions

Date	Type	Commentaire
22/06/2009	D?montage, graissage et remontage tige de manoeuvre	

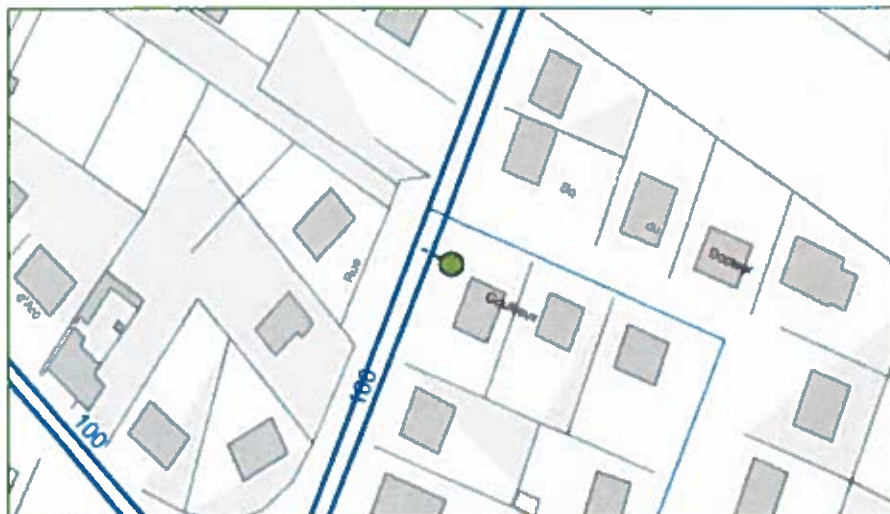

Type	Poteau incendie
Adresse	259 RUE FLORENCE ADRIAN
Date de pose	
Diametre	100
Marque	Pont-à-Mousson
Statut	Public
Pression	Oui
Conformite (*)	Conforme
Dernière Opération	06/04/2017
Disponibilité	Oui

Aucune Photo Disponible

Visites

Date épreuve	Responsable	Coffre cassé	Présence bouchon	Commentaire
06/04/2017	CROCHET LUDOVIC	SO	Oui	
09/05/2016	DOS SANTOS LAURENT	SO	Oui	
23/02/2015	DOS SANTOS LAURENT	SO	Oui	
24/02/2014	DOS SANTOS LAURENT	SO	Oui	
26/06/2013	DOS SANTOS LAURENT	SO	Oui	

Mesures


Date épreuve	Heure d'épreuve	Pression statique(bar)	Pression dynamique (bars)	Pression dynamique secondaire (bars)	Débit maximum (m3/h)	Débit 1 bar (m3)
06/04/2017	09:14:00	7.3	1		74	70
09/05/2016	14:01:00	7.2	1		87	80
23/02/2015	14:31:00	7.5	1		86	81
24/02/2014	08:57:00	7	1		71	65
26/06/2013	11:23:00	7.5	1		86	80

Entretiens - Interventions

Date	Type	Commentaire
05/10/2009	Remplacement tige de manoeuvre et clapet de pied type Saphir ou similaire	+Kit de montage
05/10/2009	Remplacement bouchons, chainettes et raccord symétriques DN65	Pose d'un bouchonde 100 mm +deux bouchons de 65 mm



Type	Poteau incendie
Adresse	1 RESIDENCE DES MESANGES
Date de pose	
Diametre	100
Marque	Pont-à-Mousson
Statut	Public
Pression	Oui
Conformite (*)	Conforme
Dernière Opération	07/04/2017
Disponibilité	Oui

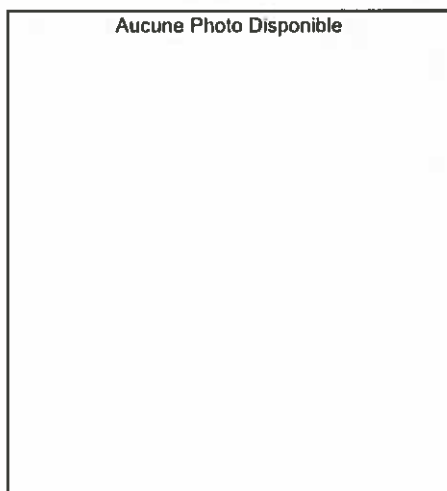

Visites

Date épreuve	Responsable	Coffre cassé	Présence bouchon	Commentaire
07/04/2017	CROCHET LUDOVIC	SO	Oui	
09/05/2016	DOS SANTOS LAURENT	SO	Oui	
23/02/2015	DOS SANTOS LAURENT	SO	Oui	
24/02/2014	DOS SANTOS LAURENT	SO	Oui	
26/06/2013	DOS SANTOS LAURENT	SO	Oui	

Mesures

Date épreuve	Heure d'épreuve	Pression statique(bar)	Pression dynamique (bars)	Pression dynamique secondaire (bars)	Débit maximum (m3/h)	Débit 1 bar (m3)
07/04/2017	08:40:00	7	1		110	102
09/05/2016	14:02:00	7.2	1		124	111
23/02/2015	14:23:00	7.4	1		119	114
24/02/2014	08:58:00	7.3	1		113	101
26/06/2013	11:24:00	7.5	1		133	125

Entretiens - Interventions

Date	Type	Commentaire
------	------	-------------



Type	Poteau incendie
Adresse	559 RUE MARCEL POULIN
Date de pose	
Diametre	100
Marque	PAM/RATIONNEL
Statut	Public
Pression	Oui
Conformite (*)	Conforme
Dernière Opération	06/04/2017
Disponibilité	Oui

Aucune Photo Disponible

Visites

Date épreuve	Responsable	Coffre cassé	Présence bouchon	Commentaire
06/04/2017	CROCHET LUDOVIC	SO	Oui	
09/05/2016	DOS SANTOS LAURENT	SO	Oui	
23/02/2015	DOS SANTOS LAURENT	SO	Oui	Dur à la manoeuvre, plus manque un bouchon diamètre 65mm
24/02/2014	DOS SANTOS LAURENT	SO	Oui	
26/06/2013	DOS SANTOS LAURENT	SO	Oui	

Mesures


Date épreuve	Heure d'épreuve	Pression statique(bar)	Pression dynamique (bars)	Pression dynamique secondaire (bars)	Débit maximum (m3/h)	Débit 1 bar (m3)
06/04/2017	09:06:00	7.3	1		138	126
09/05/2016	14:03:00	7.4	1		147	133
23/02/2015	14:54:00	7.4	1		151	141
24/02/2014	08:59:00	7.3	1		140	127
26/06/2013	11:24:00	7.5	1		176	152

Entretiens - Interventions

Date	Type	Commentaire
06/04/2017	AUTRE	Réparation du presse étoupe du poteau le 20/04/2017
23/02/2015	D?montage, graissage et remontage tige de manoeuvre	Entretien fait le 08/04/2015
23/02/2015	Remplacement bouchons, chaînettes et raccord symétriques DN65	Pose d'un bouchon symétrique DN 65 : Fait le 08/05/2015
22/06/2009	D?montage, graissage et remontage tige de manoeuvre	



Type	Poteau incendie
Adresse	819 RUE MARCEL POULIN
Date de pose	
Diametre	100
Marque	PAM/RATIONNEL
Statut	Public
Pression	Oui
Conformite (*)	Conforme
Dernière Opération	06/04/2017
Disponibilité	Oui

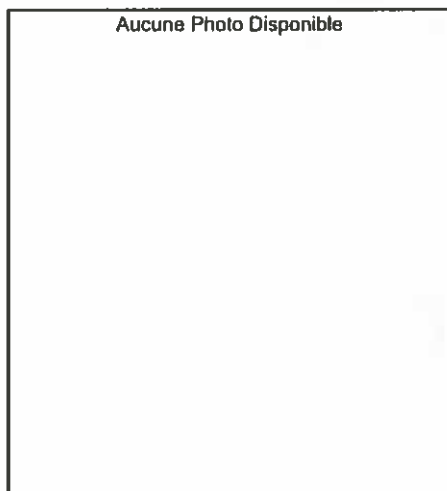

Visites

Date épreuve	Responsable	Coffre cassé	Présence bouchon	Commentaire
06/04/2017	CROCHET LUDOVIC	SO	Oui	
09/05/2016	DOS SANTOS LAURENT	SO	Oui	
23/02/2015	DOS SANTOS LAURENT	SO	Oui	Dur à la manoeuvre
24/02/2014	DOS SANTOS LAURENT	SO	Oui	
26/06/2013	DOS SANTOS LAURENT	SO	Oui	

Mesures

Date épreuve	Heure d'épreuve	Pression statique(bar)	Pression dynamique (bars)	Pression dynamique secondaire (bars)	Débit maximum (m3/h)	Débit 1 bar (m3)
06/04/2017	08:48:00	6.5	1		146	135
09/05/2016	14:04:00	6.7	1		169	154
23/02/2015	14:56:00	6.8	1		160	148
24/02/2014	09:00:00	6.8	1		157	142
26/06/2013	11:25:00	7	1		182	165

Entretiens - Interventions

Date	Type	Commentaire
23/02/2015	D?montage, graissage et remontage tige de manoeuvre	Entretien fait : Le 08/04/2015
19/06/2010	D?montage, graissage et remontage tige de manoeuvre	



Type	Poteau incendie
Adresse	5 RESIDENCE CONSTANT BOURGEOIS
Date de pose	
Diametre	100
Marque	Bayard - Emeraude
Statut	Public
Pression	Oui
Conformite (*)	Conforme
Dernière Opération	06/04/2017
Disponibilité	Oui

Aucune Photo Disponible

Visites

Date épreuve	Responsable	Coffre cassé	Présence bouchon	Commentaire
06/04/2017	CROCHET LUDOVIC	Non	Oui	
09/05/2016	DOS SANTOS LAURENT	Non	Oui	
23/02/2015	DOS SANTOS LAURENT	Non	Oui	
24/02/2014	DOS SANTOS LAURENT	Non	Oui	
26/06/2013	DOS SANTOS LAURENT	Non	Oui	

Mesures

Date épreuve	Heure d'épreuve	Pression statique(bar)	Pression dynamique (bars)	Pression dynamique secondaire (bars)	Débit maximum (m3/h)	Débit 1 bar (m3)
06/04/2017	08:55:00	6.5	1		119	108
09/05/2016	14:04:00	6.7	1		121	113
23/02/2015	14:58:00	6.8	1		125	114
24/02/2014	09:01:00	6.8	1		122	109
26/06/2013	11:26:00	7	1		134	124

Entretiens - Interventions

Date	Type	Commentaire



Type	Poleau incendie
Adresse	435 RUE DU LIEUTENANT GABRIEL LALANNE
Date de pose	
Diametre	100
Marque	Bayard - Saphir
Statut	Public
Pression	Oui
Conformite (*)	Conforme
Dernière Opération	06/04/2017
Disponibilité	Oui

Aucune Photo Disponible

Visites


Date épreuve	Responsable	Coffre cassé	Présence bouchon	Commentaire
06/04/2017	CROCHET LUDOVIC	SO	Oui	
09/05/2016	DOS SANTOS LAURENT	SO	Oui	
23/02/2015	DOS SANTOS LAURENT	SO	Oui	
24/02/2014	DOS SANTOS LAURENT	SO	Oui	
26/06/2013	DOS SANTOS LAURENT	SO	Oui	

Mesures

Date épreuve	Heure d'épreuve	Pression statique(bar)	Pression dynamique (bars)	Pression dynamique secondaire (bars)	Débit maximum (m3/h)	Débit 1 bar (m3)
06/04/2017	14:11:00	5.7	1		71	67
09/05/2016	14:07:00	5.8	1		73	68
23/02/2015	14:42:00	6	1		75	64
24/02/2014	09:03:00	5.7	1		76	63
26/06/2013	11:27:00	6	1		85	80

Entretiens - Interventions

Date	Type	Commentaire

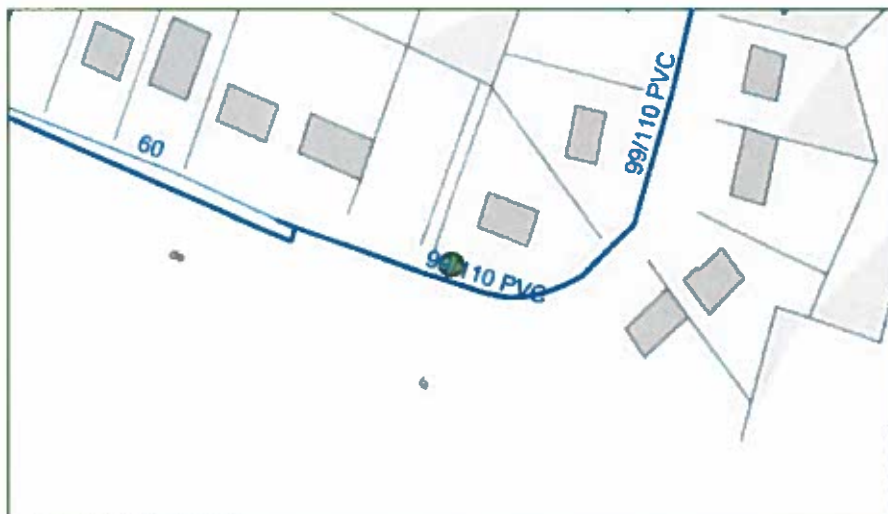

Type	Poteau incendie
Adresse	330 RUE DES ACACIAS
Date de pose	
Diametre	100
Marque	Pont-à-Mousson
Statut	Public
Pression	Oui
Conformite (*)	Conforme
Dernière Opération	06/04/2017
Disponibilité	Oui

Aucune Photo Disponible

Visites

Date épreuve	Responsable	Coffre cassé	Présence bouchon	Commentaire
06/04/2017	CROCHET LUDOVIC	SO	Oui	
09/05/2016	DOS SANTOS LAURENT	SO	Oui	
23/02/2015	DOS SANTOS LAURENT	SO	Oui	
24/02/2014	DOS SANTOS LAURENT	SO	Oui	
26/06/2013	DOS SANTOS LAURENT	SO	Oui	

Mesures


Date épreuve	Heure d'épreuve	Pression statique(bar)	Pression dynamique (bars)	Pression dynamique secondaire (bars)	Débit maximum (m3/h)	Débit 1 bar (m3)
06/04/2017	09:24:00	7	1		203	193
09/05/2016	14:08:00	7.2	1		213	184
23/02/2015	14:24:00	7	1		210	193
24/02/2014	09:04:00	7	1		206	181
26/06/2013	11:28:00	7	1		214	197

Entretiens - Interventions

Date	Type	Commentaire
------	------	-------------



Type	Poteau incendie
Adresse	RUE DU BRULE
Date de pose	
Diametre	80
Marque	Pont-à-Mousson
Statut	Public
Pression	Oui
Conformite (*)	Non Conforme
Dernière Opération	06/04/2017
Disponibilité	Oui

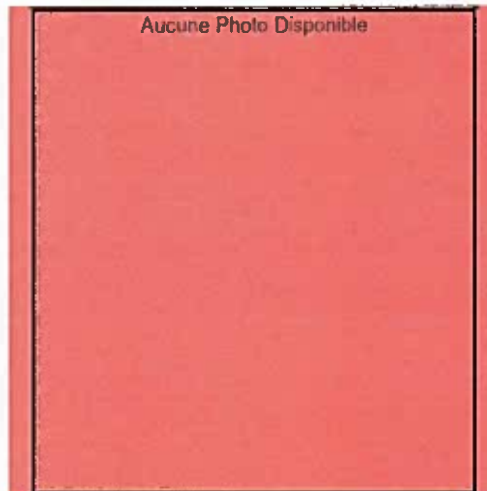

Visites

Date épreuve	Responsable	Coffre cassé	Présence bouchon	Commentaire
06/04/2017	CROCHET LUDOVIC	SO	Oui	Débit à 0.6 b 30 m3/h
09/05/2016	DOS SANTOS LAURENT	SO	Oui	Débit à 0.6 b 29 m3/h
23/02/2015	DOS SANTOS LAURENT	SO	Oui	Manque un bouchon diamètre 65mm
24/02/2014	DOS SANTOS LAURENT	SO	Oui	
26/06/2013	DOS SANTOS LAURENT	SO	Oui	

Mesures


Date épreuve	Heure d'épreuve	Pression statique(bar)	Pression dynamique (bars)	Pression dynamique secondaire (bars)	Débit maximum (m3/h)	Débit 1 bar (m3)
06/04/2017	10:27:00	7	1		31	28
09/05/2016	14:08:00	7	1		31	28
23/02/2015	14:50:00	7.3	1		30	29
24/02/2014	09:05:00	6.7	1		32	28
26/06/2013	11:29:00	7.5	1		32	31

Entretiens - Interventions

Date	Type	Commentaire
23/02/2015	Remplacement bouchons, chainettes et raccord symétriques DN65	Pose d'un symétrique dn 65 : fait le 08/04/2015



Type	Poteau incendie
Adresse	8 IMPASSE DE LA PLACE
Date de pose	
Diametre	80
Marque	Bayard
Statut	Public
Pression	Oui
Conformite (*)	Non Conforme
Dernière Opération	06/04/2017
Disponibilité	Oui

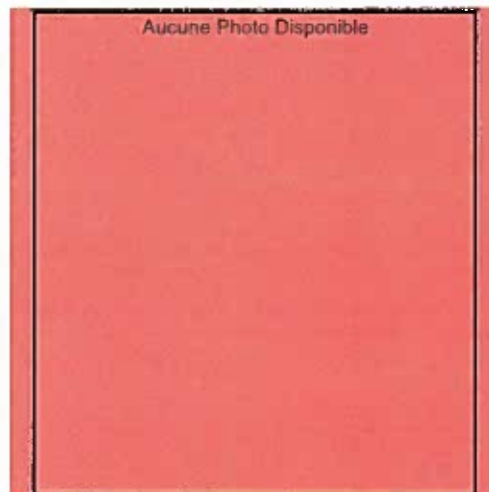

Visites

Date épreuve	Responsable	Coffre cassé	Présence bouchon	Commentaire
06/04/2017	CROCHET LUDOVIC	Oui	Oui	Débit à 0.6 b 29 m3/h
09/05/2016	DOS SANTOS LAURENT	Oui	Oui	Débit à 0.6 b 28 m3/h
23/02/2015	DOS SANTOS LAURENT	SO	Oui	Manque un bouchon diamètre 40mm
24/02/2014	DOS SANTOS LAURENT	SO	Oui	
26/06/2013	DOS SANTOS LAURENT	SO	Oui	

Mesures


Date épreuve	Heure d'épreuve	Pression statique(bar)	Pression dynamique (bars)	Pression dynamique secondaire (bars)	Débit maximum (m3/h)	Débit 1 bar (m3)
06/04/2017	10:17:00	7	1		30	28
09/05/2016	14:09:00	7.2	1		30	26
23/02/2015	14:52:00	7.2	1		31	29
24/02/2014	09:06:00	3	1		29	23
26/06/2013	11:29:00	7.5	1		32	29

Entretiens - Interventions

Date	Type	Commentaire
23/02/2015	Remplacement bouchons, chainettes et raccord symétriques DN65	Pose d'un bouchon symétrique dn 40 : fait le 08/04/2015



Type	Poteau incendie
Adresse	176 RUE DE FRENICHES
Date de pose	
Diametre	100
Marque	Bayard - Saphir
Statut	Public
Pression	Oui
Conformite (*)	Non Conforme
Dernière Opération	06/04/2017
Disponibilité	Oui

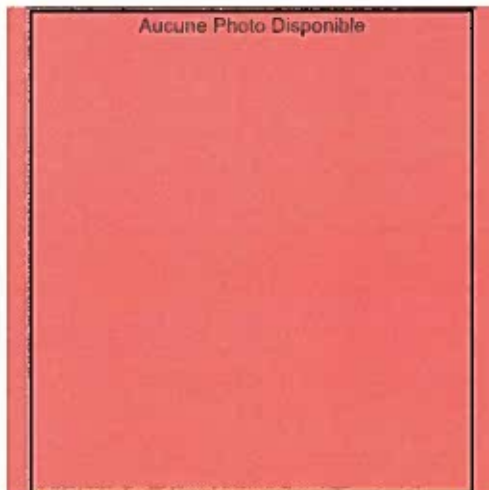

Visites


Date épreuve	Responsable	Coffre cassé	Présence bouchon	Commentaire
06/04/2017	CROCHET LUDOVIC	SO	Oui	Débit à 0.6 b 47 m3/h
09/05/2016	DOS SANTOS LAURENT	SO	Oui	Débit à 0.6 b 48 m3/h
23/02/2015	DOS SANTOS LAURENT	SO	Oui	
24/02/2014	DOS SANTOS LAURENT	SO	Oui	
26/06/2013	DOS SANTOS LAURENT	SO	Oui	

Mesures


Date épreuve	Heure d'épreuve	Pression statique(bar)	Pression dynamique (bars)	Pression dynamique secondaire (bars)	Débit maximum (m3/h)	Débit 1 bar (m3)
06/04/2017	15:44:00	7.5	1		53	45
09/05/2016	14:10:00	7.5	1		52	46
23/02/2015	14:41:00	8	1		53	47
24/02/2014	09:07:00	7.5	1		60	56
26/06/2013	11:30:00	8	1		62	60

Entretiens - Interventions

Date	Type	Commentaire
18/06/2009	D?montage, graissage et remontage tige de manoeuvre	

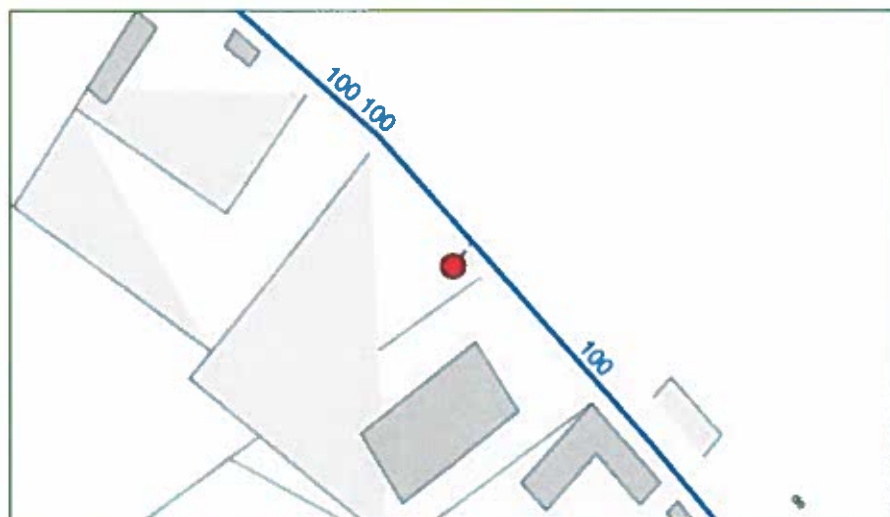

Type	Poteau incendie
Adresse	651 RUE DE FRENICHES
Date de pose	
Diametre	100
Marque	PAM/RATIONNEL
Statut	Public
Pression	Oui
Conformite (*)	Non Conforme
Dernière Opération	06/04/2017
Disponibilité	Oui

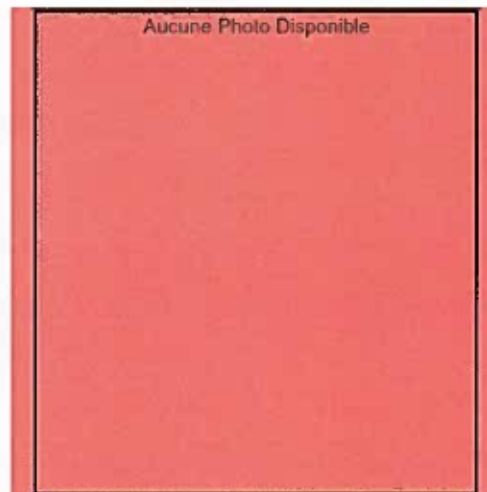

Visites


Date épreuve	Responsable	Coffre cassé	Présence bouchon	Commentaire
06/04/2017	CROCHET LUDOVIC	SO	Oui	Débit à 0.6 h 46 m3/h
09/05/2016	DOS SANTOS LAURENT	SO	Oui	Débit à 0.6 b 41 m3/h
23/02/2015	DOS SANTOS LAURENT	SO	Oui	
24/02/2014	DOS SANTOS LAURENT	SO	Oui	
26/06/2013	DOS SANTOS LAURENT	SO	Oui	

Mesures


Date épreuve	Heure d'épreuve	Pression statique(bar)	Pression dynamique (bars)	Pression dynamique secondaire (bars)	Débit maximum (m3/h)	Débit 1 bar (m3)
06/04/2017	15:36:00	7	1		58	43
09/05/2016	14:11:00	7	1		48	39
23/02/2015	14:40:00	7.5	1		48	42
24/02/2014	09:07:00	7.2	1		54	50
26/06/2013	11:31:00	7.5	1		57	54

Entretiens - Interventions

Date	Type	Commentaire
------	------	-------------

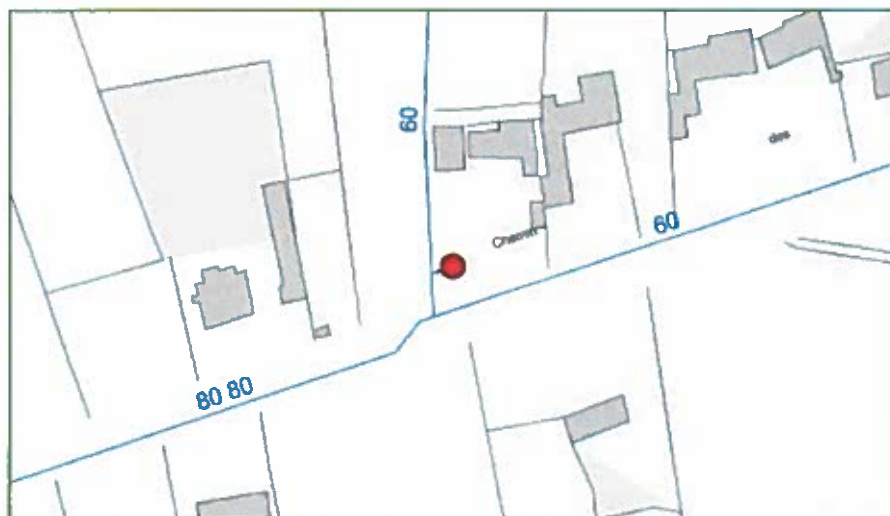

Type	Poteau incendie
Adresse	15 CHEMIN DES ETANGS DE BEINES
Date de pose	
Diametre	80
Marque	Pont-à-Mousson
Statut	Public
Pression	Oui
Conformite (*)	Non Conforme
Dernière Opération	07/04/2017
Disponibilité	Oui

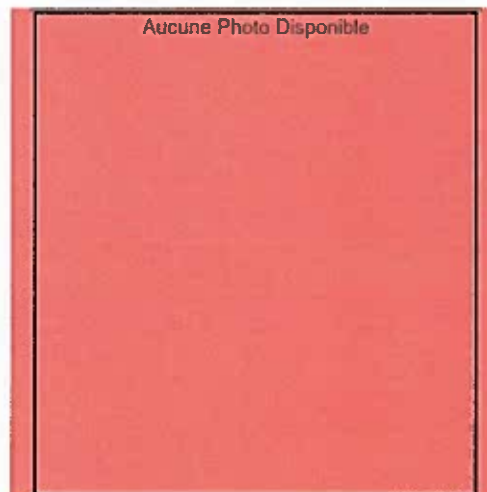

Visites


Date épreuve	Responsable	Coffre cassé	Présence bouchon	Commentaire
07/04/2017	CROCHET LUDOVIC	Non	Oui	Débit à 0.6 b 14 m3/h
09/05/2016	DOS SANTOS LAURENT	Non	Oui	Débit à 0.6 b 14 m3/h
23/02/2015	DOS SANTOS LAURENT	Non	Oui	
24/02/2014	DOS SANTOS LAURENT	Non	Oui	
26/06/2013	DOS SANTOS LAURENT	Non	Oui	

Mesures


Date épreuve	Heure d'épreuve	Pression statique(bar)	Pression dynamique (bars)	Pression dynamique secondaire (bars)	Débit maximum (m3/h)	Débit 1 bar (m3)
07/04/2017	09:14:00	6	1		15	13
09/05/2016	14:12:00	5.9	1		16	12
23/02/2015	14:36:00	6	1		16	14
24/02/2014	09:08:00	5.7	1		17	15
26/06/2013	11:31:00	6	1		16	15

Entretiens - Interventions

Date	Type	Commentaire
------	------	-------------

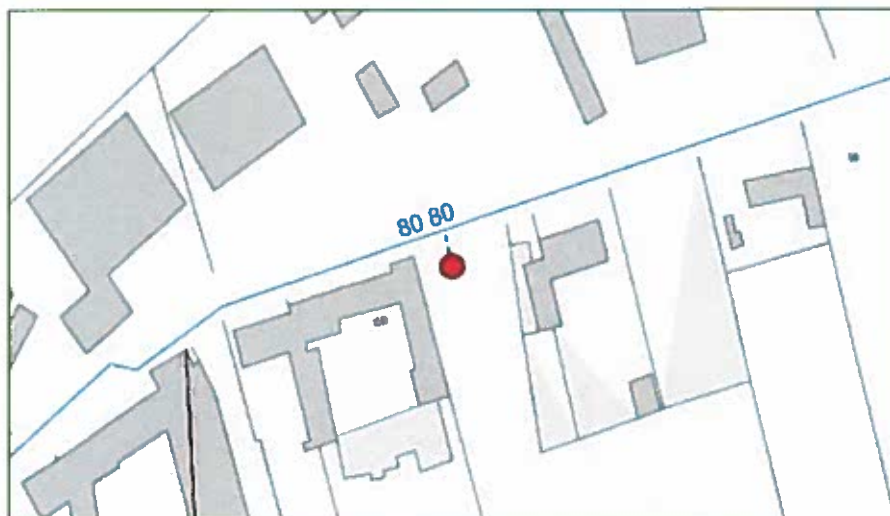

Type	Poteau incendie
Adresse	203 RUE DE LA WARNELLE
Date de pose	
Diametre	80
Marque	Pont-à-Mousson
Statut	Public
Pression	Oui
Conformite (*)	Non Conforme
Dernière Opération	07/04/2017
Disponibilité	Oui

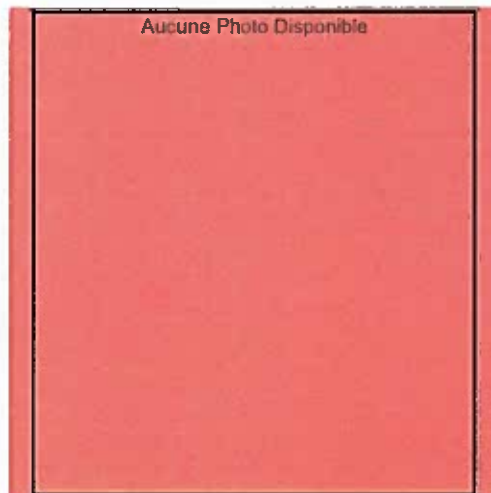

Visites

Date épreuve	Responsable	Coffre cassé	Présence bouchon	Commentaire
07/04/2017	CROCHET LUDOVIC	Non	Oui	Débit à 0.6 b 14 m3/h
09/05/2016	DOS SANTOS LAURENT	Non	Oui	Débit à 0.6 b 15 m3/h
23/02/2015	DOS SANTOS LAURENT	Non	Oui	
24/02/2014	DOS SANTOS LAURENT	Non	Oui	
26/06/2013	DOS SANTOS LAURENT	Non	Oui	

Mesures


Date épreuve	Heure d'épreuve	Pression statique(bar)	Pression dynamique (bars)	Pression dynamique secondaire (bars)	Débit maximum (m3/h)	Débit 1 bar (m3)
07/04/2017	09:08:00	6.2	1		16	13
09/05/2016	14:12:00	5.9	1		17	13
23/02/2015	14:36:00	6	1		17	15
24/02/2014	09:09:00	6	1		18	15
26/06/2013	11:32:00	6.5	1		18	16

Entretiens - Interventions

Date	Type	Commentaire
------	------	-------------



Type	Poteau incendie
Adresse	230 HAMEAU DE ROUVREL
Date de pose	
Diametre	60
Marque	Pont-à-Mousson
Statut	Public
Pression	Oui
Conformite (*)	Non Conforme
Dernière Opération	06/04/2017
Disponibilité	Oui

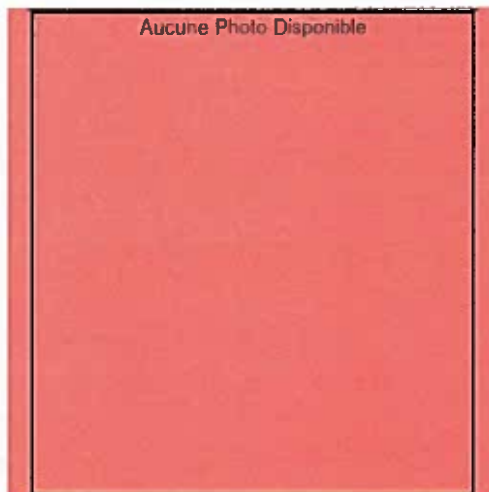

Visites

Date épreuve	Responsable	Coffre cassé	Présence bouchon	Commentaire
06/04/2017	CROCHET LUDOVIC	Non	Oui	Débit à 0.6 b 6 m3/h
09/05/2016	DOS SANTOS LAURENT	Non	Oui	Débit à 0.6 b 7 m3/h
23/02/2015	DOS SANTOS LAURENT	Non	Oui	
24/02/2014	DOS SANTOS LAURENT	Non	Oui	
26/06/2013	DOS SANTOS LAURENT	Non	Oui	

Mesures


Date épreuve	Heure d'épreuve	Pression statique(bar)	Pression dynamique (bars)	Pression dynamique secondaire (bars)	Débit maximum (m3/h)	Débit 1 bar (m3)
06/04/2017	15:21:00	5	1		9	5
09/05/2016	14:13:00	5.5	1		11	5
23/02/2015	14:37:00	4.8	1		10	6
24/02/2014	09:10:00	4.5	1		13	5
26/06/2013	11:33:00	4.8	1		13	6

Entretiens - Interventions

Date	Type	Commentaire
------	------	-------------



Type	Poteau incendie
Adresse	CHATEAU DE MESMY. HAMEAU DE TIRLANCOURT
Date de pose	
Diametre	100
Marque	PAM/RATIONNEL
Statut	Public
Pression	Oui
Conformite (*)	Non Conforme
Dernière Opération	06/04/2017
Disponibilité	Oui

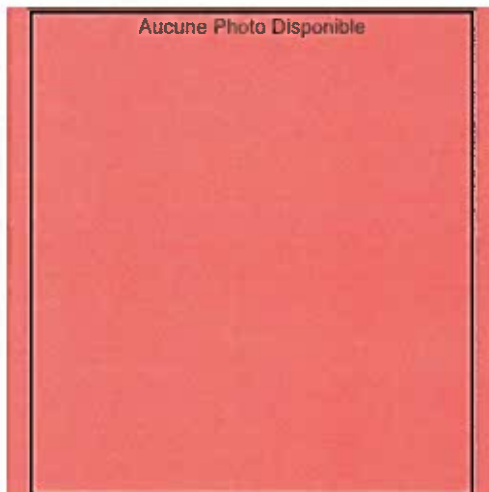

Visites

Date épreuve	Responsable	Coffre cassé	Présence bouchon	Commentaire
06/04/2017	CROCHET LUDOVIC	SO	Oui	Débit à 0.6 b 25 m3/h
09/05/2016	DOS SANTOS LAURENT	SO	Oui	Débit à 0.6 b 28 m3/h
23/02/2015	DOS SANTOS LAURENT	SO	Oui	
24/02/2014	DOS SANTOS LAURENT	SO	Oui	
26/06/2013	DOS SANTOS LAURENT	SO	Oui	

Mesures

Date épreuve	Heure d'épreuve	Pression statique(bar)	Pression dynamique (bars)	Pression dynamique secondaire (bars)	Débit maximum (m3/h)	Débit 1 bar (m3)
06/04/2017	15:09:00	4.8	1		26	24
09/05/2016	14:14:00	5	1		32	26
23/02/2015	14:38:00	5	1		32	29
24/02/2014	09:13:00	5	1		43	39
26/06/2013	11:35:00	5	1		46	43

Entretiens - Interventions

Date	Type	Commentaire
11/03/2011	D?montage, graissage et remontage lige de manoeuvre	



Type	Poteau incendie
Adresse	147 RUE DU POTAGER
Date de pose	
Diametre	100
Marque	Bayard - Saphir
Statut	Public
Pression	Oui
Conformite (*)	Conforme
Dernière Opération	06/04/2017
Disponibilité	Oui

Aucune Photo Disponible

Visites


Date épreuve	Responsable	Coffre cassé	Présence bouchon	Commentaire
06/04/2017	CROCHET LUDOVIC	SO	Oui	
09/05/2016	DOS SANTOS LAURENT	SO	Oui	
23/02/2015	DOS SANTOS LAURENT	SO	Oui	
24/02/2014	DOS SANTOS LAURENT	SO	Oui	
26/06/2013	DOS SANTOS LAURENT	SO	Oui	

Mesures

Date épreuve	Heure d'épreuve	Pression statique(bar)	Pression dynamique (bars)	Pression dynamique secondaire (bars)	Débit maximum (m3/h)	Débit 1 bar (m3)
06/04/2017	11:14:00	7.4	1		142	128
09/05/2016	14:15:00	7.4	1		145	122
23/02/2015	14:19:00	7.5	1		151	143
24/02/2014	09:14:00	7.5	1		145	136
26/06/2013	11:35:00	7.7	1		176	161

Entretiens - Interventions

Date	Type	Commentaire

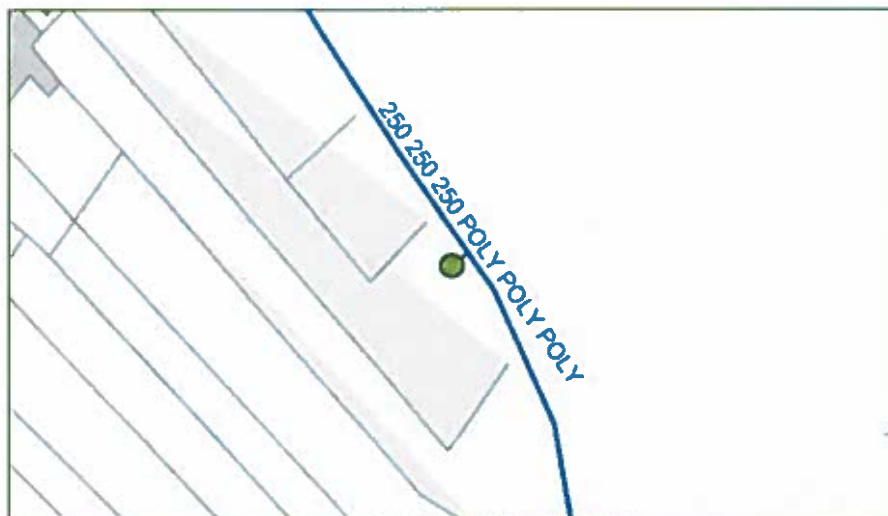

Type	Poteau incendie
Adresse	VOIE COMMUNALE N 9
Date de pose	
Diametre	100
Marque	Bayard - Saphir
Statut	Public
Pression	Non
Conformite (*)	Conforme
Dernière Opération	07/04/2017
Disponibilité	Oui

Aucune Photo Disponible

Visites

Date épreuve	Responsable	Coffre cassé	Présence bouchon	Commentaire
07/04/2017	CROCHET LUDOVIC	SO	Non	
09/05/2016	DOS SANTOS LAURENT	SO	Non	
23/02/2015	DOS SANTOS LAURENT	SO	Non	
24/02/2014	DOS SANTOS LAURENT	SO	Non	
27/06/2013	DOS SANTOS LAURENT	SO	Non	

Mesures

Date épreuve	Heure d'épreuve	Pression statique(bar)	Pression dynamique (bars)	Pression dynamique secondaire (bars)	Débit maximum (m3/h)	Débit 1 bar (m3)
07/04/2017	08:53:00	6	1		92	89
09/05/2016	14:16:00	6	1		101	93
23/02/2015	14:18:00	6	1		101	91
24/02/2014	09:14:00	6	1		85	76
27/06/2013	11:38:00	6.5	1		222	203

Entretiens - Interventions

Date	Type	Commentaire
20/09/2010	Remplacement bouchons, chainettes et raccord symétriques DN65	Pose d'un bouchon de 65 mm
18/06/2009	Remplacement bouchons, chainettes et raccord symétriques DN65	Pose de deux bouchons de 65 mm



Type	Poteau incendie
Adresse	10 RUE DE L' ORANGERIE
Date de pose	
Diametre	100
Marque	Bayard - Saphir
Statut	Public
Pression	Oui
Conformite (*)	Conforme
Dernière Opération	06/04/2017
Disponibilité	Oui

Aucune Photo Disponible

Visites

Date épreuve	Responsable	Coffre cassé	Présence bouchon	Commentaire
06/04/2017	CROCHET LUDOVIC	SO	Oui	
09/05/2016	DOS SANTOS LAURENT	SO	Oui	
23/02/2015	DOS SANTOS LAURENT	SO	Oui	
24/02/2014	DOS SANTOS LAURENT	SO	Oui	
27/06/2013	DOS SANTOS LAURENT	SO	Oui	

Mesures


Date épreuve	Heure d'épreuve	Pression statique(bar)	Pression dynamique (bars)	Pression dynamique secondaire (bars)	Débit maximum (m3/h)	Débit 1 bar (m3)
06/04/2017	11:05:00	7.4	1		139	127
09/05/2016	14:16:00	7.4	1		156	139
23/02/2015	14:20:00	7.7	1		159	149
24/02/2014	09:15:00	7.4	1		144	134
27/06/2013	11:39:00	8	1		176	165

Entretiens - Interventions

Date	Type	Commentaire



Type	Poteau incendie
Adresse	17 RUE DU PARC
Date de pose	
Diametre	100
Marque	SMHM
Statut	Public
Pression	Oui
Conformite (*)	Conforme
Dernière Opération	06/04/2017
Disponibilité	Oui

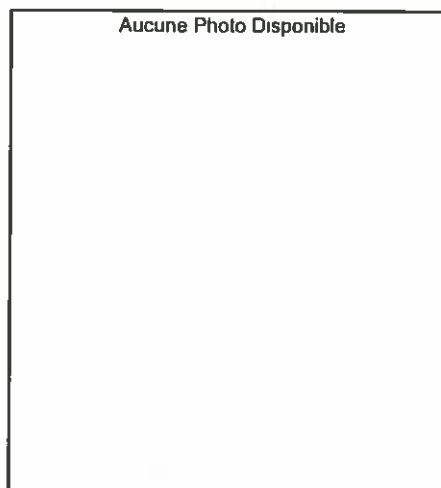

Visites

Date épreuve	Responsable	Coffre cassé	Présence bouchon	Commentaire
06/04/2017	CROCHET LUDOVIC	SO	Oui	
09/05/2016	DOS SANTOS LAURENT	SO	Oui	
23/02/2015	DOS SANTOS LAURENT	SO	Oui	
24/02/2014	DOS SANTOS LAURENT	SO	Oui	
27/06/2013	DOS SANTOS LAURENT	SO	Oui	

Mesures

Date épreuve	Heure d'épreuve	Pression statique(bar)	Pression dynamique (bars)	Pression dynamique secondaire (bars)	Débit maximum (m3/h)	Débit 1 bar (m3)
06/04/2017	11:22:00	7	1		129	120
09/05/2016	14:17:00	7	1		142	133
23/02/2015	14:22:00	7	1		139	132
24/02/2014	09:16:00	7.	1		134	117
27/06/2013	11:40:00	7.2	1		158	145

Entretiens - Interventions

Date	Type	Commentaire
------	------	-------------

No	Type	Date de pose	Marque	Diamètre	Présence bouchon	Pression statique en bars	Pression résiduelle à 60 m3/h	Conformité (*)	Date dernière opération	Débit à 1 bar	Adresse	Commentaire
?	Citerne incendie			Inconnu				Inconnue			ROUTE DE GUISCARD	
?	Citerne incendie			Inconnu				Non conforme	24/02/2014		704 VOIE COMMUNALE N 9	
1	Poteau Incendie		BAYARD/ SAPHIR	100	Oui	7	1	Conforme	06/04/2017	99	137 RUE DU GENERAL LECLERC	
2	Poteau Incendie		PAM/ RATIONNE	100	Oui	6	1	Conforme	06/04/2017	89	365 RUE DU GENERAL LECLERC	
3	Poteau Incendie		BAYARD/ SAPHIR	100	Oui	7	1	Conforme	06/04/2017	84	170 RUE HELENE VERSEPUY	
4	Poteau Incendie		PAM/ RATIONNE	100	Oui	7.5	1	Conforme	06/04/2017	62	568 RUE HELENE VERSEPUY	
5	Poteau Incendie		BAYARD/ SAPHIR	100	Oui	5.5	1	Conforme	06/04/2017	85	206 RUE DE L' EQUIPEE	
6	Poteau Incendie		Pont-à-Mousson	100	Oui	0	0	Non conforme	09/05/2016	0	3 SQUARE DU GENERAL WEYGAND	Poteau d'incendie plus. Inclus dans la tournée. PI privé. USINE DANA
7	Poteau Incendie		BAYARD/ SAPHIR	100	Oui	7	1	Conforme	06/04/2017	96	178 RUE MARCEL VISEUR	
8	Bouche Incendie		BAYARD	100	Sans objet	7.2	1	Conforme	06/04/2017	114	14 RUE DE L' EGLISE	
9	Poteau Incendie		Pont-à-Mousson - Tri - 80	60	Oui	7.5	1	Non conforme	06/04/2017	39	217 RUE DU CHATEAU	Débit à 0.6 b 41 m3/h
10	Poteau Incendie		Pont-à-Mousson	60	Oui	7.4	1	Non conforme	06/04/2017	44	63 RUE FLORENCE ADRIAN	Débit à 0.6 b 46 m3/h
11	Poteau Incendie		PAM/ RATIONNE	100	Oui	7.3	1	Conforme	06/04/2017	130	358 RUE MARCEL POULIN	
12	Poteau Incendie		BAYARD/ SAPHIR	80	Oui	7	1	Non conforme	06/04/2017	47	20 RUE MARCEL VISEUR	Débit à 0.6 b 49 m3/h
13	Poteau Incendie		Bayard Emeraude	100	Non	7.6	1	Conforme	06/04/2017	113	216 RUE DU CHEMIN BLANC	
14	Poteau Incendie		Pont-à-Mousson	100	Oui	7.4	1	Conforme	06/04/2017	139	170 RUE DES ACACIAS	
15	Poteau Incendie		Pont-à-Mousson	100	Oui	7.3	1	Conforme	06/04/2017	70	259 RUE FLORENCE ADRIAN	
16	Poteau Incendie		Pont-à-Mousson	100	Oui	7	1	Conforme	07/04/2017	102	1 RESIDENCE DES MESANGES	

No	Type	Date de pose	Marque	Diamètre	Présence bouchon	Pression statique en bars	Pression résiduelle à 60 m3/h	Conformité (*)	Date dernière opération	Débit à 1 bar	Adresse	Commentaire
17	Poteau Incendie		PAM/RATIONNE	100	Oui	7.3	1	Conforme	06/04/2017	126	559 RUE MARCEL POULIN	
18	Poteau Incendie		PAM/RATIONNE	100	Oui	6.5	1	Conforme	06/04/2017	135	819 RUE MARCEL POULIN	
19	Poteau Incendie		Bayard Emeraude	100	Oui	6.5	1	Conforme	06/04/2017	108	5 RESIDENCE CONSTANT BOURGEOIS	
20	Poteau Incendie		BAYARD/SAPHIR	100	Oui	5.7	1	Conforme	06/04/2017	67	435 RUE DU LIEUTENANT GABRIEL LALANNE	
21	Poteau Incendie		Pont-à-Mousson	100	Oui	7	1	Conforme	06/04/2017	193	330 RUE DES ACACIAS	
22	Poteau Incendie		Pont-à-Mousson	80	Oui	7	1	Non conforme	06/04/2017	28	RUE DU BRULE	Débit à 0.6 b 30 m3/h
23	Poteau Incendie		BAYARD	80	Oui	7	1	Non conforme	06/04/2017	28	8 IMPASSE DE LA PLACE	Débit à 0.6 b 29 m3/h
24	Poteau Incendie		BAYARD/SAPHIR	100	Oui	7.5	1	Non conforme	06/04/2017	45	176 RUE DE FRENICHES	Débit à 0.6 b 47 m3/h
25	Poteau Incendie		PAM/RATIONNE	100	Oui	7	1	Non conforme	06/04/2017	43	651 RUE DE FRENICHES	Débit à 0.6 h 46 m3/h
26	Poteau Incendie		Pont-à-Mousson	80	Oui	6	1	Non conforme	07/04/2017	13	15 CHEMIN DES ETANGS DE BEINES	Débit à 0.6 b 14 m3/h
27	Poteau Incendie		Pont-à-Mousson	80	Oui	6.2	1	Non conforme	07/04/2017	13	203 RUE DE LA WARNELLE	Débit à 0.6 b 14 m3/h
29	Poteau Incendie		Pont-à-Mousson	60	Oui	5	1	Non conforme	06/04/2017	5	230 HAMEAU DE ROUVREL	Débit à 0.6 b 6 m3/h
30	Poteau Incendie		PAM/RATIONNE	100	Oui	4.8	1	Non conforme	06/04/2017	24	CHATEAU DE MESMY, HAMEAU DE TIRLANCOURT	Débit à 0.6 b 25 m3/h
31	Poteau Incendie		BAYARD/SAPHIR	100	Oui	7.4	1	Conforme	06/04/2017	128	147 RUE DU POTAGER	
32	Poteau Incendie		BAYARD/SAPHIR	100	Non	6	1	Conforme	07/04/2017	89	VOIE COMMUNALE N 9	
33	Poteau Incendie		BAYARD/SAPHIR	100	Oui	7.4	1	Conforme	06/04/2017	127	10 RUE DE L' ORANGERIE	
34	Poteau Incendie		SMHM	100	Oui	7	1	Conforme	06/04/2017	120	17 RUE DU PARC	
